



# SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO

**PNRR** Ministero della  
Salute

#NEXTGENERATIONITALIA

Cruscotto di Monitoraggio





*Ministero della Salute*

# MANUALE UTENTE

CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO - PNRR MISSIONE 6  
SALUTE

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

# Sommario

1 - INTRODUZIONE	3
1.1 - CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO	3
2 - DATABASE	4
3 - PARTE SINISTRA DEL CRUSCOTTO	5
3.1 - TITOLO	5
3.2 - FILTRI	6
3.3 - TABELLA PIVOT	7
3.3.1 - PULSANTE DI ESPANSIONE	8
4 - PARTE DESTRA DEL CRUSCOTTO	9
4.1 - RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE	9
4.2 - CALENDARIO	10
4.3 - DIAGRAMMA DI GANTT	11

# 1 - Introduzione

La Missione 6 del PNRR prevede la realizzazione di una serie di Misure, il cui finanziamento è subordinato ad una serie di Milestone e Target da raggiungere entro scadenze prefissate. Si rende necessario quindi vigilare attentamente su tali processi di realizzazione attraverso un accurato monitoraggio degli step procedurali previsti dai vari cronoprogrammi. In attesa dell'implementazione del Sistema ReGiS con funzioni di monitoraggio è stato approntato un sistema di controllo utilizzando il software Excel. Tale programma è stato scelto in quanto di uso comune e già disponibile agli uffici della Unità di Missione.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di fornire all'utente che utilizza il **Cruscotto di monitoraggio** una guida all'inserimento dei dati e al loro monitoraggio.

## 1.1 - Cruscotto di monitoraggio

Il **Cruscotto di monitoraggio** è un sistema di controllo che confronta il cronoprogramma di una misura con lo stato di attuazione della stessa, allo scopo di evidenziare eventuali criticità. Si tratta di una cartella di lavoro in Excel composta da quattro fogli di calcolo:

- Il primo foglio contiene il **Cruscotto**, composto da una **Tabella pivot** e da una serie di **Rappresentazioni grafiche**.
- Il secondo foglio contiene tabelle pivot di appoggio, che collaborano al funzionamento delle **Rappresentazioni grafiche**.
- Il terzo foglio è il **Database**, che alimenta la Tabella pivot e che va aggiornato costantemente con l'inserimento dei dati negli opportuni campi.
- Il quarto foglio riporta i giorni feriali dell'anno e viene utilizzata dal **Calendario** inserito nella parte destra del **Cruscotto**.

Ogni **Cruscotto di monitoraggio** mostra gli step procedurali di una singola misura.

## 2 - Database

M&T	SEQUENZIALE	STEP ATTUATIVO-PROCEDURALE	STEP DI MONITORAGGIO	REGIONE/PROVINCIA	INIZIO	FINE	TEMPO	TRASCORSO	IMPIEGATO	OBIETTIVI	COMPLETATI	AVANZAMENTO
-	-	01 - Decreto di Ripartizione delle risorse	-	-	23/09/2021	20/01/2022	119	119	100%	6	6	100%
-	-	02 - Accordo Ministero della Salute - Agenas - Dipartimento per la trasformazione digitale	-	-	15/07/2021	31/12/2021	169	169	100%	1	1	100%
Milestone	MC1-00-ITA-9	03 - Ricognizione da parte delle Regioni dei siti idonei per la realizzazione delle COT	-	-	24/05/2021	30/09/2021	129	129	100%	1	1	100%
Target	MC1-00-ITA-10	04 - Definizione e approvazione del progetto "Portale della Trasparenza"	-	-	21/09/2021	31/12/2021	101	101	100%	2	2	100%
Milestone	MC1-00-ITA-12	05 - Individuazione siti idonei per la realizzazione delle COT	-	-	27/09/2021	30/12/2021	94	94	100%	1	1	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Abruzzo	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	13	13	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Basilicata	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	6	6	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Calabria	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	19	19	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Campania	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	58	62	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Emilia-Romagna	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	45	45	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Friuli-Venezia Giulia	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	12	12	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Lazio	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	59	59	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Liguria	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	15	16	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Lombardia	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	101	101	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Marche	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	15	15	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Molise	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	3	3	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Piemonte	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	43	43	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Puglia	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	40	40	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Sardegna	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	16	16	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Sicilia	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	49	50	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Toscana	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	37	37	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Umbria	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	9	9	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Valle d'Aosta	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	1	1	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Veneto	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	49	40	82%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Bolzano	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	5	5	100%
Milestone	MC1-5	06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-	Trento	01/09/2021	31/05/2022	272	225	83%	5	5	100%
Target	MC1-00-ITA-14	07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-	Abruzzo	01/01/2022	30/06/2022	180	103	57%	13	0	0%
Target	MC1-00-ITA-14	07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-	Basilicata	01/01/2022	30/06/2022	180	103	57%	6	0	0%
Target	MC1-00-ITA-14	07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-	Calabria	01/01/2022	30/06/2022	180	103	57%	19	0	0%
Target	MC1-00-ITA-14	07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-	Campania	01/01/2022	30/06/2022	180	103	57%	58	0	0%
Target	MC1-00-ITA-14	07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-	Emilia-Romagna	01/01/2022	30/06/2022	180	103	57%	45	0	0%

Il **Database** raccoglie tutte le informazioni utilizzate dalla **Tabella pivot**, dai **Filtri** e dai grafici del **Cruscotto**. In particolare, le colonne Milestone/Target, Sequenziale e Regioni/Province vengono utilizzate dai **Filtri**.

Il **Database** contiene i dati relativi agli step procedurali della misura, con tempi e stati di attuazione. In particolare:

- Nella parte sinistra sono riportati Milestone/Target, i loro numeri sequenziali, gli step attuativo-procedurali, seguiti da eventuali step di monitoraggio, suddivisi per Regione nei casi previsti. Ove necessario viene aggiunta la colonna Fonte, che consente di distinguere i finanziamenti del PNRR da quelli del PNC.
- Nella parte centrale sono indicate le date di inizio e fine di ogni step procedurale, seguite dal calcolo del tempo a disposizione e del tempo trascorso, aggiornato automaticamente alla data corrente. Il tempo impiegato corrisponde alla percentuale di tempo trascorso sul tempo a disposizione.
- Nella parte destra è riportato il numero di obiettivi che compone ogni singolo step. Nel caso di Target è riportato il numero di interventi da raggiungere. Nel caso di Milestone, ove ritenuto opportuno, è stato suddiviso lo step in fasi di attuazione. Gli obiettivi completati concorrono a determinare la percentuale di avanzamento.

Le colonne Tempo, Trascorso, Impiegato e Avanzamento si compilano automaticamente in base ai dati inseriti nelle colonne Inizio, Fine, Obiettivi e Completati, pertanto non è opportuno modificarle. L'utente dovrà tenere aggiornati esclusivamente i dati afferenti alla colonna Completati.

### 3 - Parte sinistra del Cruscotto

M6C1-SI1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)								da 24/05/2021 a 30/06/2026							
M&T	Sequenziale							REGIONE/PROVINCIA							
-	-	M6C1-00-ITA-10	M6C1-00-ITA-12	M6C1-00-ITA-13	M6C1-00-ITA-14	M6C1-00-ITA-15	M6C1-00-ITA-16	-	Abruzzo	Basilicata	Bolzano	Calabria	Ca		
Milestone	M6C1-00-ITA-17	M6C1-00-ITA-18	M6C1-00-ITA-19	M6C1-00-ITA-20	M6C1-00-ITA-21	M6C1-00-ITA-22	M6C1-00-ITA-23	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Pie		
Target	M6C1-00-ITA-24	M6C1-00-ITA-26	M6C1-00-ITA-29	M6C1-00-ITA-30	M6C1-00-ITA-9	M6C1-5	M6C1-7	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Valle d'A...	Ve		
STEP ATTUATIVO-PROCEDURALE		STEP DI MONITORAGGIO		REGIONE/PROVINCIA		INIZIO	FINE	TEMPO	TRASCORSO	IMPIEGATO	OBIETTIVI	COMPLETATI	AVANZAMENTO		
01 - Decreto di Ripartizione delle risorse		-				23/09/2021	20/01/2022	119	119	100%	6	6	100%		
02 - Accordo Ministero della Salute - Agenas - Dipartimento per la trasformazione digitale		-				15/07/2021	31/12/2021	169	169	100%	1	1	100%		
03 - Ricognizione da parte delle Regioni dei siti idonei per la realizzazione delle COT		-				24/05/2021	30/09/2021	129	129	100%	1	1	100%		
04 - Definizione e approvazione del progetto "Portale della Trasparenza"		-				21/09/2021	31/12/2021	101	101	100%	2	2	100%		
05 - Individuazione siti idonei per la realizzazione delle COT		-				27/09/2021	30/12/2021	94	94	100%	1	1	100%		
06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo		-				01/09/2021	31/05/2022	5712	4683	82%	600	597	99%		
07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT		-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	600	0	0%		
08 - Assegnazione di almeno 105 codici CUP per l'interconnessione aziendale		-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	21	0	0%		
09 - Assegnazione di un codice CUP per il progetto pilota che fornisca gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria		-				03/01/2022	30/06/2022	178	99	56%	1	0	0%		
10 - Approvazione di almeno 600 progetti idonei per indizione della gara per realizzare le COT		-				01/06/2022	30/09/2022	2541	0	0%	600	0	0%		
11 - Approvazione di almeno 105 progetti idonei per indizione della gara per l'interconnessione aziendale		-				01/06/2022	30/09/2022	2541	0	0%	21	0	0%		
12 - Approvazione di un progetto idoneo per l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria		-				30/06/2022	30/09/2022	92	0	0%	1	0	0%		
13 - Assegnazione di almeno 600 codici CIG per realizzar le COT		-				01/06/2022	31/03/2023	120897	0	0%	25650	0	0%		
14 - Assegnazione di almeno 105 codici CIG per l'interconnessione aziendale		-				01/06/2022	31/03/2023	6363	0	0%	21	0	0%		
15 - Assegnazione di un codice CIG per progetto pilota che fornisca gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria		-				01/06/2022	31/03/2023	303	0	0%	1	0	0%		
16 - Stipula di almeno 600 contratti per la realizzazione delle COT		-				01/04/2023	30/06/2023	3780	0	0%	2700	0	0%		
17 - Stipula di almeno 105 contratti per l'interconnessione aziendale		-				01/04/2023	30/06/2023	1890	0	0%	21	0	0%		
18 - Stipula di un contratto per progetto pilota per strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria		-				01/09/2022	30/06/2023	302	0	0%	1	0	0%		
19 - Implementazione dei servizi di Intelligenza Artificiale a supporto dell'assistenza primaria		-				01/05/2022	30/06/2023	425	0	0%	1	0	0%		

Nella parte sinistra del **Cruscotto** sono riportate tutti gli step procedurali, con i relativi tempi e stati di attuazione.

#### 3.1 - Titolo

M6C1-SI1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)								da 24/05/2021 a 30/06/2026							
M&T	Sequenziale							REGIONE/PROVINCIA							
	-	M6C1-00-ITA-10	M6C1-00-ITA-12	M6C1-00-ITA-13	M6C1-00-ITA-14	M6C1-00-ITA-15	M6C1-00-ITA-16	-	Abruzzo	Basilicata	Bolzano	Calabria	Ca		
	Milestone	M6C1-00-ITA-17	M6C1-00-ITA-18	M6C1-00-ITA-19	M6C1-00-ITA-20	M6C1-00-ITA-21	M6C1-00-ITA-22	M6C1-00-ITA-23	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Pie	
	Target	M6C1-00-ITA-24	M6C1-00-ITA-26	M6C1-00-ITA-29	M6C1-00-ITA-30	M6C1-00-ITA-9	M6C1-5	M6C1-7	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Valle d'Al	Ve	
STEP ATTUATIVO-PROCEDURALE		STEP DI MONITORAGGIO		REGIONE/PROVINCIA		INIZIO	FINE	TEMPO	TRASCORSO	IMPIEGATO	OBIETTIVI	COMPLETATI	AVANZAMENTO		
01 - Decreto di Ripartizione delle risorse		-				23/09/2021	20/01/2022	119	119	100%	6	6	<div><div>100%</div></div>		
02 - Accordo Ministero della Salute - Agenas - Dipartimento per la trasformazione digitale		-				15/07/2021	31/12/2021	169	169	100%	1	1	<div><div>100%</div></div>		
03 - Ricognizione da parte delle Regioni dei siti idonei per la realizzazione delle COT		-				24/05/2021	30/09/2021	129	129	100%	1	1	<div><div>100%</div></div>		
04 - Definizione e approvazione del progetto "Portale della Trasparenza"		-				21/09/2021	31/12/2021	101	101	100%	2	2	<div><div>100%</div></div>		
05 - Individuazione siti idonei per la realizzazione delle COT		-				27/09/2021	30/12/2021	94	94	100%	1	1	<div><div>100%</div></div>		
06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo		-				01/09/2021	31/05/2022	5712	4683	82%	600	597	<div><div>99%</div></div>		
07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT		-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	600	0	<div><div>0%</div></div>		
08 - Assegnazione di almeno 105 codici CUP per l'interconnessione aziendale		-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	21	0	<div><div>0%</div></div>		
09 - Assegnazione di un codice CUP per il progetto pilota che															

Nella parte superiore del **Cruscotto** è riportato il titolo della misura e il periodo di tempo preso in considerazione dagli step procedurali. Utilizzando i **Filtri**, il periodo di tempo visualizzato si adatta automaticamente.

### 3.2 - Filtri

M6C1-SI1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)								da 24/05/2021 a 30/06/2026							
M&T	Sequenziale							REGIONE/PROVINCIA							
-	-	M6C1-00-ITA-10	M6C1-00-ITA-12	M6C1-00-ITA-13	M6C1-00-ITA-14	M6C1-00-ITA-15	M6C1-00-ITA-16	-	Abruzzo	Basilicata	Bolzano	Calabria	Car		
Milestone	M6C1-00-ITA-17	M6C1-00-ITA-18	M6C1-00-ITA-19	M6C1-00-ITA-20	M6C1-00-ITA-21	M6C1-00-ITA-22	M6C1-00-ITA-23	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Pie		
Target	M6C1-00-ITA-24	M6C1-00-ITA-26	M6C1-00-ITA-29	M6C1-00-ITA-30	M6C1-00-ITA-9	M6C1-5	M6C1-7	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Valle d'A...	Ve		
STEP ATTUATIVO-PROCEDURALE		STEP DI MONITORAGGIO			REGIONE/PROVINCIA		INIZIO	FINE	TEMPO	TRASCORSO	IMPIEGATO	OBIETTIVI	COMPLETATI	AVANZAMENTO	
01 - Decreto di Ripartizione delle risorse		-			-		23/09/2021	20/01/2022	119	119	100%	6	6	100%	
02 - Accordo Ministero della Salute - Agenas - Dipartimento per la trasformazione digitale		-			-		15/07/2021	31/12/2021	169	169	100%	1	1	100%	
03 - Ricognizione da parte delle Regioni dei siti idonei per la realizzazione delle COT		-			-		24/05/2021	30/09/2021	129	129	100%	1	1	100%	
04 - Definizione e approvazione del progetto "Portale della Trasparenza"		-			-		21/09/2021	31/12/2021	101	101	100%	2	2	100%	
05 - Individuazione siti idonei per la realizzazione delle COT		-			-		27/09/2021	30/12/2021	94	94	100%	1	1	100%	
06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo		-			-		01/09/2021	31/05/2022	5712	4683	82%	600	597	99%	
07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT		-			-		01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	600	0	0%	
08 - Assegnazione di almeno 105 codici CUP per l'interconnessione aziendale		-			-		01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	21	0	0%	
09 - Assegnazione di un codice CUP per il progetto pilota che															

Sotto i **Titoli** sono presenti i **Filtri**, che permettono di visualizzare gli step procedurali in base a milestone/target, numero sequenziale, Regione e, ove previsto, fonte di finanziamento selezionati.



### 3.3 - Tabella pivot

M6C1-SI1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)													
da 24/05/2021 a 30/06/2026													
M&T	Sequenziale							REGIONE/PROVINCIA					
-	-	M6C1-00-ITA-10	M6C1-00-ITA-12	M6C1-00-ITA-13	M6C1-00-ITA-14	M6C1-00-ITA-15	M6C1-00-ITA-16	-	Abruzzo	Basilicata	Bolzano	Calabria	Car
Milestone	M6C1-00-ITA-17	M6C1-00-ITA-18	M6C1-00-ITA-19	M6C1-00-ITA-20	M6C1-00-ITA-21	M6C1-00-ITA-22	M6C1-00-ITA-23	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Pie
Target	M6C1-00-ITA-24	M6C1-00-ITA-26	M6C1-00-ITA-29	M6C1-00-ITA-30	M6C1-00-ITA-9	M6C1-5	M6C1-7	Sicilia	Toscana	Trento	Umbria	Valle d'A...	Ve
STEP ATTUATIVO-PROCEDURALE	STEP DI MONITORAGGIO		REGIONE/PROVINCIA		INIZIO	FINE	TEMPO	TRASCORSO	IMPIEGATO	OBIETTIVI	COMPLETATI	AVANZAMENTO	
01 - Decreto di Ripartizione delle risorse	-				23/09/2021	20/01/2022	119	119	100%	6	6	100%	
02 - Accordo Ministero della Salute - Agenas - Dipartimento per la trasformazione digitale	-				15/07/2021	31/12/2021	169	169	100%	1	1	100%	
03 - Ricognizione da parte delle Regioni dei siti idonei per la realizzazione delle COT	-				24/05/2021	30/09/2021	129	129	100%	1	1	100%	
04 - Definizione e approvazione del progetto "Portale della Trasparenza"	-				21/09/2021	31/12/2021	101	101	100%	2	2	100%	
05 - Individuazione siti idonei per la realizzazione delle COT	-				27/09/2021	30/12/2021	94	94	100%	1	1	100%	
06 - Approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo	-				01/09/2021	31/05/2022	5712	4683	82%	600	597	99%	
07 - Assegnazione di almeno 600 codici CUP per realizzare le COT	-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	600	0	0%	
08 - Assegnazione di almeno 105 codici CUP per l'interconnessione aziendale	-				01/01/2022	30/06/2022	3780	2121	56%	21	0	0%	
09 - Assegnazione di un codice CUP per il progetto pilota che fornisca gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria	-				03/01/2022	30/06/2022	178	99	56%	1	0	0%	
10 - Approvazione di almeno 600 progetti idonei per indizione della gara per realizzare le COT	-				01/06/2022	30/09/2022	2541	0	0%	600	0	0%	
11 - Approvazione di almeno 105 progetti idonei per indizione della gara per l'interconnessione aziendale	-				01/06/2022	30/09/2022	2541	0	0%	21	0	0%	
12 - Approvazione di un progetto idoneo per l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria	-				30/06/2022	30/09/2022	92	0	0%	1	0	0%	
13 - Assegnazione di almeno 600 codici CIG per realizzar le COT	-				01/06/2022	31/03/2023	120897	0	0%	25650	0	0%	
14 - Assegnazione di almeno 105 codici CIG per l'interconnessione aziendale	-				01/06/2022	31/03/2023	6363	0	0%	21	0	0%	
15 - Assegnazione di un codice CIG per progetto pilota che fornisca gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria	-				01/06/2022	31/03/2023	303	0	0%	1	0	0%	
16 - Stipula di almeno 600 contratti per la realizzazione delle COT	-				01/04/2023	30/06/2023	3780	0	0%	2700	0	0%	
17 - Stipula di almeno 105 contratti per l'interconnessione aziendale	-				01/04/2023	30/06/2023	1890	0	0%	21	0	0%	
18 - Stipula di un contratto per progetto pilota per strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria	-				01/09/2022	30/06/2023	302	0	0%	1	0	0%	
19 - Implementazione dei servizi di Intelligenza Artificiale a supporto dell'assistenza primaria	-				01/05/2022	30/06/2023	425	0	0%	1	0	0%	

La parte principale del **Cruscotto** è costituita dalla **Tabella pivot**, che importa dal **Database** tutti gli step procedurali della misura con tempi e stati di attuazione. È fondamentale prestare attenzione a non modificare mai i valori contenuti in questa tabella. L'inserimento dei dati va eseguito all'interno della Database contenuto nell'omonima cartella del file. Una volta completato l'inserimento dei dati, occorre tornare nella cartella Cruscotto, premere il tasto destro del mouse e selezionare Aggiorna. La **Tabella pivot** e tutti i grafici verranno immediatamente aggiornati.

Nella **Tabella pivot** sono inoltre evidenziati alcuni valori in base ai seguenti criteri:

- Il tempo impiegato assume una colorazione rossa se è superiore alla percentuale di avanzamento degli obiettivi, verde se è inferiore.
- La percentuale di avanzamento viene visualizzata per mezzo di una barra dei dati, in modo da favorirne la lettura, soprattutto nel caso di un numero elevato di step procedurali.






## 4 - Parte destra del Cruscotto



Nella parte destra del **Cruscotto** sono riportate le principali **Rappresentazioni grafiche**, il **Calendario** e il **Diagramma di Gantt**.

### 4.1 - Rappresentazioni grafiche

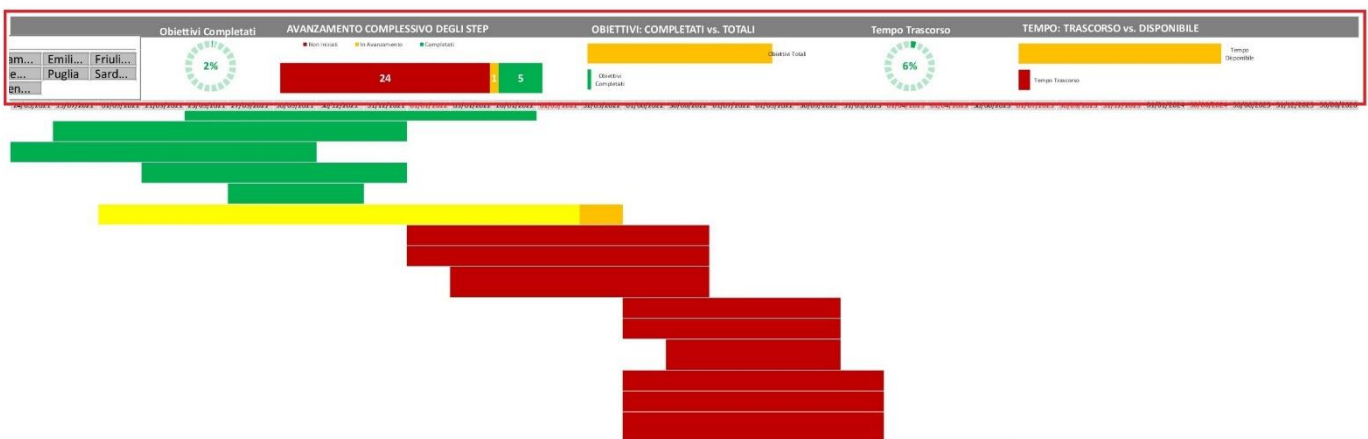

Nella parte superiore vengono mostrati i seguenti grafici:

- Due cerchi di Ricarica, riguardanti gli Obiettivi Completati (Obiettivi Completati/Obiettivi Totali) e il Tempo Trascorso (Tempo Trascorso/Tempo a Disposizione).
- Grafico a barre in pila, che permette di confrontare immediatamente il numero di step non iniziati, in avanzamento e completati.
- Due grafici a barre, che confrontano gli obiettivi completati con quelli totali, e il tempo trascorso sul tempo a disposizione.

## 4.2 - Calendario



Sotto alle **Rappresentazioni Grafiche**, un **Calendario** sintetico riporta le date corrispondenti ai singoli step procedurali, cioè relative all'inizio o alla fine di uno step compreso nel cronoprogramma. Le date festive sono evidenziate in rosso.

### 4.3 - Diagramma di Gantt



Nell parte principale, il **Diagramma di Gantt** mostra le tempistiche di ogni singolo step procedurale del cronoprogramma, colorando gli step in base alla Percentuale di Avanzamento (verde se l'avanzamento è del 100%, giallo se l'avanzamento è maggiore del tempo trascorso, arancione se l'avanzamento è minore del tempo trascorso, rosso se l'avanzamento è dello 0%).
